

ПРОТОКОЛ № 2

заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа»

от 18.04.2024 г.

г. Дальнегорск

Присутствуют:

Комиссия в составе:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Острошенко
Владимир Алексеевич | - заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа, председатель комиссии |
| Баркаева
Юлия Николаевна | - начальник отдела архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, заместитель председателя комиссии |
| Горбач
Лев Эдуардович | - главный специалист 2 разряда отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, секретарь комиссии |

Члены комиссии:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Выголов
Григорий Михайлович | - председатель общественной организации «Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов г. Дальнегорска» |
| Игумнова
Надежда Олеговна | - начальник отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа |
| Рубцов
Александр Евгеньевич | - заместитель председателя Думы Дальнегорского городского округа, член комитета по бюджету и экономической политике |
| Харламов
Никита Юрьевич | - председатель Думы Дальнегорского городского округа, член партии «Единая Россия» |
| Черепкин
Алексей Михайлович | - эксперт Регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Приморском крае |

Отсутствуют члены комиссии:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Артемьева
Светлана Викторовна | - депутат Думы Дальнегорского городского округа, член комитета по местному самоуправлению и законности; по бюджету и экономической политике |
| Макарова
Наталья Александровна | - председатель Дальнегорского городского общества инвалидов |
| Рудаев
Юрий Владимирович | - депутат Думы Дальнегорского городского округа, член комитета по городскому хозяйству |

Повестка заседания общественной комиссии:

1. Утверждение повестки заседания общественной комиссии (Острошенко В.А.).
2. О ходе реализации в 2024 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» по состоянию на 18.04.2024 (Игумнова Н.О.).
3. О ходе реализации в 2024 году подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» по состоянию на 18.04.2024 (Игумнова Н.О.).
4. Об утверждении ежемесячных отчетов о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа».
5. Разное:
 - об исключении из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» и о пересмотре очередности участия дворовых территорий в подпрограмме;
 - замена и утверждение материалов, используемых при благоустройстве дворовой территории многоквартирного дома № 3а по ул. Химиков;
 - рассмотрение возможности выполнения дополнительных работ по благоустройству общественной территории Сквера у монумента «Героям-Дальнегорцам», не предусмотренных текущим локальным-сметным расчетом;
 - о согласовании нового разбивочного плана благоустройства Сквера у монумента «Героям-Дальнегорцам», плана расстановки приборов освещения и схем прокладки сетей питания и материала, используемого при устройстве мемориальных стен по предложению Подрядной организации;
 - принятие решения о видах работ, планируемых к реализации при благоустройстве общественной территории парка им. Пушкина в 2024 году.
6. О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа».

Вопрос № 1 повестки заседания общественной комиссии.

Острошенко В.А. огласил повестку заседания общественной комиссии.

Решение общественной комиссии по вопросу № 1 повестки заседания:

Утвердить повестку работы общественной комиссии, предложенную председателем общественной комиссии.

Проголосовали единогласно «за» 8 (восемь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

Вопрос № 2 повестки заседания общественной комиссии.

Игумнова Н.О. довела до сведения присутствующих, что по состоянию на 18.04.2024г. заключен муниципальный контракт на благоустройство Сквера у монумента «Героям - Дальнегорцам», расположенного примерно в 77 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 99а. Подрядчик ООО «КОМФОРТ СТРОЙ». Стоимость работ по контракту составит 18 207 642,12 рублей.

15.04.2024, в соответствии с утвержденным графиком выполнения работ по контракту,

подрядная организация приступила к работам по благоустройству Сквера у монумента «Героям-Дальнегорцам».

Решение общественной комиссии по вопросу № 2 повестки заседания:

Принять к сведению информацию о ходе реализации в 2024 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» по состоянию на 18.04.2024

Проголосовали единогласно «за» 8 (восемь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

Вопрос № 3 повестки заседания общественной комиссии.

Игумнова Н.О. сообщила о том, что по состоянию на 18.04.2024 проведены электронные аукционы, по итогам которых заключен контракт на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 3а по ул. Химиков в г. Дальнегорске с ИП Моисеенко Ю.А.

В соответствии с утвержденным графиком выполнения работ, срок начала работ 15.04.2024, подрядная организация к работам на сегодняшний день не приступила. В отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа поступило обращение от ИП Моисеенко Ю.А. от 16.04.2024 № 11 о невозможности приступить к работам по благоустройству в связи с находящимся в стадии оформления ордера на проведение земляных работ в отделе архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа с 25.03.2024 с гарантией приступить к работам по контракту после получения ордера.

Муниципальные контракты на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 18 и № 10, 12, 13 по ул. Первомайской в с. Краснореченском (Тайга) находятся на подписании.

19.04.2024 завершается срок подачи заявок на благоустройство дворовой территории по адресу г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 19.

Планируемая дата объявления повторного аукциона по благоустройству дворовой территории по адресу г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 9 23.04.2024.

Решение общественной комиссии по вопросу № 3 повестки заседания:

Принять к сведению информацию о ходе реализации в 2024 году подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» по состоянию на 18.04.2024.

Проголосовали единогласно «за» 8 (восемь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

Вопрос № 4 повестки заседания общественной комиссии.

Игумнова Н.О., предоставила информацию о направлении в систему «ГИС ЖКХ» ежемесячной отчетности о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа», по состоянию на 01.02.2024, 01.03.2024 и 01.04.2024.

По состоянию на 01.02.2024:

1. Общее количество контрактов на текущий год: 2, из них:
 - в статусе «Контракт заключен»: 0.
 - в статусе «Приемка работ»: -.
 - в статусе «Контракт закрыт»: -.
2. Планируемая стоимость: 19 108 756 руб. 98 коп.
3. Сметная стоимость: 19 108 756 руб. 45 коп.
4. Законтрактованная стоимость: 0 руб. 00 коп.

5. Выплаченная стоимость 0.
6. Сумма экономии средств: 0 руб. 00 коп.

По состоянию на 01.03.2024:

1. Общее количество контрактов на текущий год: 2, из них:
 - в статусе «Контракт заключен»: 1.
 - в статусе «Приемка работ»: -.
 - в статусе «Контракт закрыт»: -.
2. Планируемая стоимость: 19 108 756 руб. 98 коп.
3. Сметная стоимость: 19 108 756 руб. 45 коп.
4. Законтрактованная стоимость: 0 руб. 00 коп.
5. Выплаченная стоимость 0.
6. Сумма экономии средств: 0 руб. 00 коп.

По состоянию на 01.04.2024:

1. Общее количество контрактов на текущий год: 2, из них:
 - в статусе «Контракт заключен»: 1.
 - в статусе «Приемка работ»: -.
 - в статусе «Контракт закрыт»: -.
2. Планируемая стоимость: 19 108 756 руб. 98 коп.
3. Сметная стоимость: 19 108 756 руб. 45 коп.
4. Законтрактованная стоимость: 0 руб. 00 коп.
5. Выплаченная стоимость 0.
6. Сумма экономии средств: 0 руб. 00 коп.

Решение общественной комиссии по вопросу № 4 повестки заседания:

1. Утвердить ежемесячную отчетность о ходе реализации муниципальной программы Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа, по состоянию на 01.02.2024, 01.03.2024 и 01.04.2024.

Проголосовали единогласно «за» 8 (восемь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

Вопрос № 5 повестки заседания общественной комиссии.

5.1. Игумнова Н.О. довела до сведения присутствующих, что место, определенное жителями многоквартирного дома № 19 по ул. Комсомольской в с. Каменке для установки на нем спортивной площадки, расположено за пределами границ земельного участка данного многоквартирного дома, что противоречит требованиям к обслуживанию и эксплуатации элементов благоустройства, в том числе спортивных площадок и препятствуют последующей реализации решений, принятых собственниками на общем собрании собственников:

- о включении в перечень общего имущества МКД объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий по благоустройству дворовой территории МКД;

- о принятии решения о содержании за счет средств собственников помещений в МКД объектов внешнего благоустройства.

Предложено: исключить из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» дворовую территорию многоквартирного дома № 19 по ул. Комсомольской в с. Каменка.

5.2. Учитывая межевание земельного участка на месте, определенном жителями для установки детской площадки в рамках благоустройства дворовой территории многоквартирного дома № 21 по ул. Комсомольской в с. Каменке с фактическим заходом в границы земельного

участка многоквартирного дома № 23 по ул. Комсомольской в с. Каменке, в связи с отсутствием в отделе жизнеобеспечения заявки на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома 23 по ул. Комсомольской в с. Каменке, благоустроить в 2025 году данную дворовую территорию не представляется возможным.

Предложено: перенести благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 21 на 2026 год с разъяснением собственникам многоквартирных домов № 21 и № 23 информации о необходимости подачи совместной заявки на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов в части установки детской площадки.

5.3. Перенести производство работ в части благоустройства дворовой территории многоквартирного дома № 15 по ул. Пионерской в г. Дальнегорске в рамках реализации 1 этапа (задний двор) на 2024 году в очередность участия дворовых территорий в подпрограмме «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа», благоустройство дворовой территории данного многоквартирного дома в рамках реализации 2 этапа на 2025 год.

5.4. Игумнова сообщила, что в отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа поступили предложения от ИП Моисеенко Ю.А. по замене используемых материалов и оборудования на материалы и оборудования с улучшающими характеристиками используемых при благоустройстве дворовой территории многоквартирного дома № 3а по ул. Химиков.

– В соответствии с актом о проведении входного контроля проектной документации от 02.04.2024 ИП Моисеенко Ю.А. выявлено расхождение в наименованиях применяемых материалов: счетчик электрической энергии электронный и фотореле. Подрядная организация предлагает согласовать изменение материалов без изменения сметной стоимости в соответствии с материалами, предусмотренными проектной документацией, а именно применить при монтаже электроосвещения счетчик электрической энергии электронный: Меркурий 200.02 в количестве одной штуки и фотореле ФР601 в количестве одной штуки.

Вниманию членов комиссии данного заседания представлена сравнительная таблица с указанием аналогичных и улучшающих характеристик.

№ п/п	Технические характеристики	Наименование заменяемого материала	Наименование согласовываемого материала
1	Наименование	МЕРКУРИЙ 200.04 Счетчик	Однофазный Меркурий 200.02 Счетчик
2	Номинальное напряжение, В	230	230
3	Количество тарифов	4	4
4	Исполнение по типу сети	1-фазный	1-фазный
5	Класс точности	1	1
6	Базовый / максимальный ток, А	5 (60)	5 (60)

№ п/п	Технические характеристики	Наименование заменяемого материала	Наименование согласовываемого материала
1	Наименование	Фотореле ФР2 У3	Фотореле ФР601
2	Номинальное напряжение, В	220	230
3	Диапазон рабочих температур	от -45, до +50°С	от -25, до +40°С
4	Собственная потребляемая мощность в дежурном режиме	0,25 Вт	0,25 Вт
5	Собственная потребляемая мощность при срабатывании	6,6 Вт	6,6 Вт

– Также подрядчик указал что в соответствии с локальным-сметным расчетом № 07-01-01 предусмотрено использование кронштейна для консольных и подвесных светильников, серия 1 (стандарт), марка: 1.К2-2,5-2,0-30/-О4-ц в количестве 6 штук. Данный кронштейн двухрожковый и его монтируют на осветительные столбы, он не имеет крепления к стене. В связи с чем подрядчик предложил заменить материал и произвести установку кронштейна К1П-0,5-05-48-15 за счет чего будет увеличена надежность его крепления к поверхности и увеличен срок эксплуатационных характеристик, будет исключена возможность падения, установленного на нем светильника. Предлагаемый кронштейн имеет эстетически приемлемый и менее громоздкий вид.

Вниманию членов комиссии данного заседания представлена сравнительная таблица с указанием аналогичных и улучшающих характеристик.

№ п/п	Наименование заменяемого материала	Характеристики заменяемого материала	Наименование материала с улучшенными характеристиками	Характеристики материала с улучшенными характеристиками
	ТАНС.41.189.000 (1.К2-2,5-2,0-30/-О4-ц)	Вылет кронштейна Высота кронштейна Консольный Количество рожков Двухрожковые Тип крепления кронштейна Обечайка Способ установки светильника Консольный Производство: Россия Защита металла: горячий цинк	К1П-0,5-05-48-15	Высота кронштейна, м Вылет кронштейна м Консольный Количество рожков Однорожковые Тип крепления кронштейна Приставной Способ установки светильника: Консольный Производство: Россия Защита металла: горячий цинк

– ИП Моисеенко Ю.А. обратился в отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского с предложением согласовать использование модуля МПКЧ 300.500 (ЛПК

300.500) при устройстве лотка водоотведения, который по своим техническим и качественным характеристикам полностью соответствует материалу, предусмотренному локальным-сметным расчетом № 07-01-01.

– Подрядной организацией с целью улучшения технических характеристик предложено заменить светильники FLA 02A-55-850-WL на BLR 01-58-750-WA в количестве 6 штук.

Вниманию членов комиссии данного заседания представлена сравнительная таблица с указанием аналогичных и улучшающих характеристик. Сравнительная таблица демонстрирует, что у светильников BLR- 01-58-750-WA мощность, световой поток с учетом потерь и световая эффективность больше, чем у светильников FLA-02A-55-850-WL.

№ п/п	Наименование заменяемого материала	Характеристики заменяемого материала	Наименование материала с улучшенными характеристиками	Характеристики материала с улучшенными характеристиками
	FLA02A-55-850-WL	<p>Гарантия 5 лет Срок службы изделия 10 лет Страна происхождения Россия</p> <p>Возможность кастомизации Да Мощность, Вт 55 Световой поток светодиодного модуля, Лм 9600 Световой поток светильника с учетом потерь, Лм 8085 Световая эффективность, Лм/Вт</p> <p>Кривая сила света (КСС) (широкая боковая) Цвет сечения Нейтральный белый Индекс энергоэффективности</p> <p>Коэффициент мощности ИП, cos φ 0,96 Аварийный режим Нет Гальваническая изоляция Да Защита от короткого замыкания Да Температура эксплуатации, С° от -40 до +50 Степень пылевлагозащиты светильника IP66</p>	BLR 01-58-750-WA	<p>Гарантия 5 лет Срок службы изделия 10 лет Страна происхождения Россия Особенности Встроенный пузырьковый уровень Возможность кастомизации Да Мощность, Вт 58 Световой поток светодиодного модуля, Лм 9700 Световой поток светильника с учетом потерь, Лм 9050 Световая эффективность, Лм/Вт</p> <p>Кривая сила света (КСС) (широкая осевая) Цвет сечения Комфортный белый Индекс энергоэффективности</p> <p>Коэффициент мощности ИП, cos φ 0,96 Аварийный режим Нет Гальваническая изоляция Да Защита от короткого замыкания Да Температура эксплуатации, С° от -40 до +50 Степень пылевлагозащиты светильника IP66</p>


	Вид климатического исполнения У1 Степень ударопрочности I Класс защиты от поражения электрическим током I Габариты ДхШхВ, мм 400х200х85 Масса нетто, Кг 2,9		Вид климатического исполнения У1 Степень ударопрочности I Класс защиты от поражения электрическим током I Габариты ДхШхВ,мм 422х187х84 Масса нетто, Кг 4.7
--	--	--	---

5.5. В соответствии со Статьей 716 ГК РФ «Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить заказчика». Подрядная организация, осуществляющая благоустройство общественной территории: Сквера у монумента «Героям-Дальнегорцам» в рамках муниципального контракта ООО «КОМФОРТ СТРОЙ» направило уведомление в администрацию Дальнегорского городского округа о том, что в ходе анализа и сопоставления проектной документации к локальному сметному расчету было выявлено отсутствие в ЛСР работ и материалов по устройству щебеночного основания под тротуар и бортовой камень с предложением выполнить работы по устройству щебеночного основания под тротуар и бортовой камень собственными силами с приложением обоснования по данным видам работ с общей стоимостью работ 724 235,47 рублей.

5.6. В администрацию Дальнегорского городского округа поступил запрос от ООО «КОМФОРТ СТРОЙ» о необходимости согласования внесения изменений в разбивочный план благоустройства, план расстановки приборов освещения и схемы прокладки сетей питания при благоустройстве общественной территории: Сквера у монумента «Героям-Дальнегорцам» в связи с тем что, в соответствии с текущими: разбивочным планом благоустройства, планов расстановки приборов освещения и схем прокладки сетей питания «Схемы планировочной организации земельного участка Шифр: 18.23-ПЗУ» обнаружено:


- невозможность прокладки сетей питания и установки осветительных приборов по проекту в связи с наличием большого количества деревьев;
- невозможность установки карманов на тротуарах для скамеек по проекту в связи с наличием большого количества деревьев.

Схема согласования планировочной организации земельного участка:

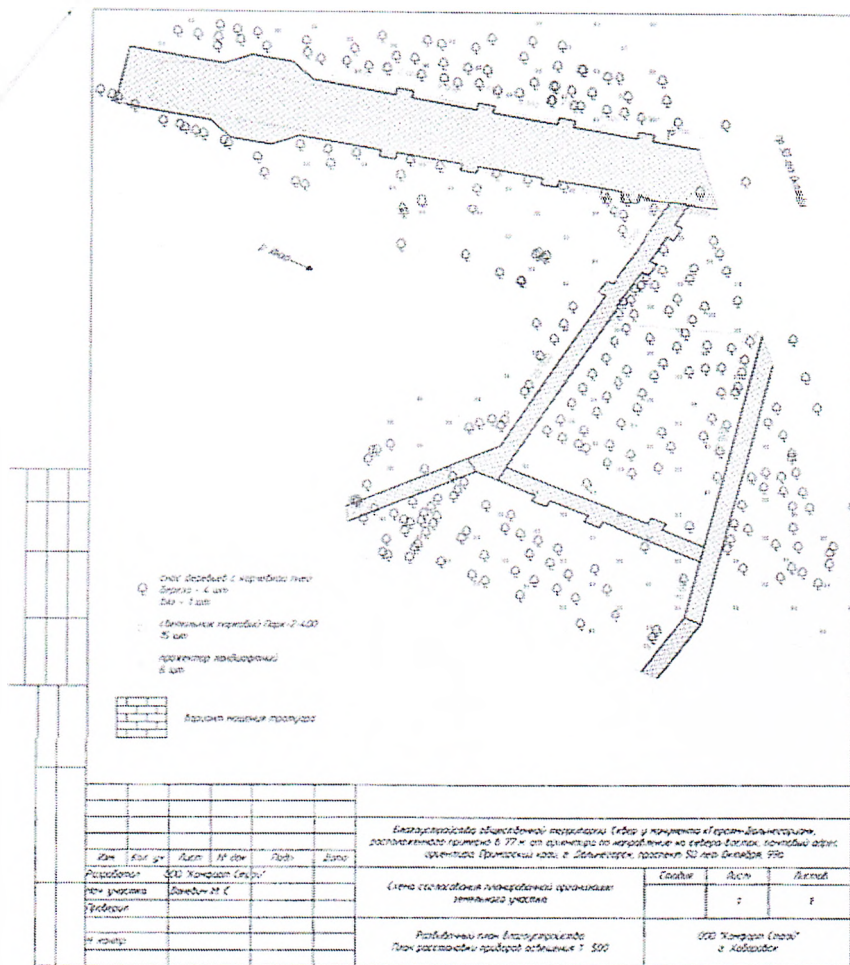

ООО «КОМФОРТ СТРОЙ» предложило согласовать мемориальные стены плиты гранитные Absolut Black размером 600x300x20 мм, которые имеют наилучший ровный черный цвет, идеально подходящий для памятников и мемориальных комплексов.

5.7. Игумнова Н.О. предложила членам общественной комиссии, присутствующим на заседании, образовавшуюся экономию в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» в 2024 году использовать для заключения муниципального контракта по благоустройству общественной территории: «Парк им. Пушкина» в части поставки малых архитектурных форм: композиции «Белка» высотой 1.7м из стеклопластика с покраской под бронзу.



Решение общественной комиссии по вопросу № 5 повестки заседания:

5.1. Исключить из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» дворовую территорию многоквартирного дома № 19 по ул. Комсомольской в с. Каменка

Проголосовали единогласно «за» 8 (восемь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

5.2. Перенести благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 21 на 2026 год с разъяснением собственникам многоквартирного дома № 23 информации о необходимости подачи заявки на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома для дальнейшего благоустройства детской площадки на совместно размежеванном земельном участке.

Проголосовали единогласно «за» 8 (восемь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

5.3. Перенести благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 15 по ул. Пионерской в рамках реализации 2 этапа в перечне дворовых территорий, планируемых к благоустройству в рамках реализации подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2025 год.

Проголосовали единогласно «за» 8 (восемь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

5.4. Согласовать замену материалов, предусмотренных локальным-сметным расчетом на материалы с аналогичными или улучшающими характеристиками, используемых при благоустройстве дворовой территории многоквартирного дома № 3а по ул. Химиков в г. Дальнегорске:

- счетчик электрической энергии электронный Меркурий 200.04 на Меркурий 200.02 в количестве 1 штуки;
- фотореле ФР2 У3 на фотореле ФР601 в количестве одной штуки;
- кронштейны для консольных и подвесных светильников серии 1 (стандарт), марки: 1.К2-2,5-2,0-30/-О4-ц на кронштейны для консольных и подвесных светильников К1П-0,5-05-48-15 в количестве 6 штук;
- светильники FLA 02A-55-850-WL на BLR 01-58-750-WA в количестве 6 штук.

Согласовать использование модуля МПКЧ 300.500 (ЛПК 300.500) при устройстве лотка водоотведения.

Проголосовали единогласно «за» 8 (восемь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

5.5. Внести существенные изменения в муниципальный контракт от 02.04.2024 № 0320300143724000039_168140 на выполнение работ по благоустройству общественной территории: Сквера у монумента «Героям-Дальнегорцам», расположенного примерно в 77 м. от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 99а, увеличив цену муниципального контракта с 18 267

642 (Восемнадцать миллионов двести шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок два) рубля 12 копеек до 18 991 877 (Восемнадцать миллионов девятьсот девяноста одна тысяча восемьсот семьдесят семь) рублей 59 копеек, в связи с увеличением объема необходимых работ по устройству щебеночного основания под тротуар и бортовой камень.

Проголосовали единогласно «за» 8 (восемь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

5.6. Согласовать ООО «КОМФОРТ СТРОЙ» новый разбивочный план благоустройства, план расстановки приборов освещения и схем прокладки сетей питания.

Согласовать мемориальные стены плиты гранитные Absolut Black размером 600x300x20 мм при благоустройстве общественной территории: Сквера у монумента «Героям-Дальнегорцам».

Проголосовали единогласно «за» 8 (восемь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

5.7. Согласовать использование образовавшейся экономии в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» в 2024 году на заключение муниципального контракта по благоустройству общественной территории: «Парк им. Пушкина» на поставку малых архитектурных форм: композиции «Белка» высотой 1.7м из стеклопластика с покраской под бронзу.

Проголосовали единогласно «за» 8 (восемь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

Вопрос № 6 повестки заседания общественной комиссии.

Игумнова Н.О. довела до сведения присутствующих о необходимости внесения изменений по принятым на данном заседании решениям в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа», а также внесении изменений в части приведения в соответствие суммы финансирования на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа».

Решение общественной комиссии по вопросу № 6 повестки заседания:

Принять к сведению доведенную до присутствующих на заседании информацию о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа»

Проголосовали единогласно «за» 8 (восемь) членов общественной комиссии, присутствующих на данном заседании.

Председатель
общественной комиссии



В. А. Острошенко

Секретарь комиссии



Л. Э. Горбач
